



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM  
 Presupuesto Autorizado: 8,167,636.00

Hoja: 21/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TRES FLORES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124032	TRES FLORES	0.00			0.00																							METRO CUADRADO	800.00		
																															PERSONA	360.00		
																															METRO CUADRADO	500.00	de 1	
SE	01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES: 5 DE MAYO ENTRE CALLES TORRE Y MIGUEL HIDALGO; MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS; MORELOS ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y BUENA VISTA Y CALLE SALIDA A LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD PLAN DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007	PLAN DEL PALMAR	0.00			0.00																								PERSONA	715.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE NIÑO ARTILLERO 2ª ETAPA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																								METRO CUADRADO	900.00	
																																PERSONA	1,500.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARIANO OTERO ENTRE CALLES JAZMIN Y SANTOS DEGOLLADO, DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																								METRO CUADRADO	900.00	
																																PERSONA	1,600.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MONTE DE SIÓN, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																								METRO CUADRADO	800.00	
																																PERSONA	1,150.00	
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CENTENARIO, PRIMERA ETAPA, TRAMO: ENTRONQUE A ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL PAPANTLA AL MONUMENTO AL VOLADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																								METRO CUADRADO	800.00	
																																PERSONA	2,200.00	
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO, PRIMERA ETAPA, TRAMO: ENTRONQUE A ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL PAPANTLA AL MONUMENTO AL VOLADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00																								METRO LINEAL	130.00	
																																PERSONA	2,150.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

8,167,636.00 8,167,636.00 0.00

Eric Dominguez Vazquez  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
 Diana Alma Bellón Díaz  
 TESORERO MUNICIPAL  
**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
 Tesorería  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS


Ricardo Wall Reyes  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
**Presidencia**  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
**Contraloría Interna**  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Anexo al oficio No. EMO/2023/PAPANTLA/86606

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301241000	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD TRES FLORES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241001	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES: 5 DE MAYO ENTRE CALLES TORRE Y MIGUEL HIDALGO; MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y MORELOS; MORELOS ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y BUENA VISTA Y CALLE SALIDA A LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD PLAN DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE NIÑO ARTILLERO 2A. ETAPA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARIANO OTERO ENTRE CALLES JAZMIN Y SANTOS DEGOLLADO, DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241004	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MONTE DE SION, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No



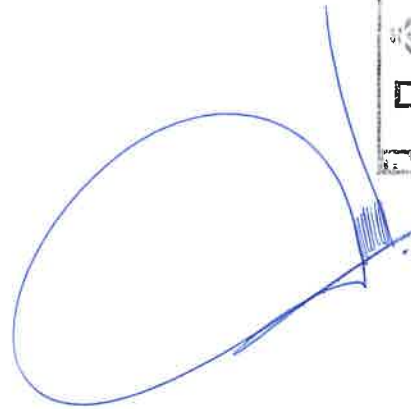

SELLO DIGITAL:

swgn7Rt5XcY4lKE9IBsMykwsEp5e3DkEVWECXSy40iHxh2FzCL7ukbB/8Apd3Gri/t0FhoqsD9OXh9YGp4TJE59kvC6OYSCZ1K2e9XIWrki4XBXYe4GzU0IDEjr6lIzsluulKxJMupewWQ/oTtl/QY5nCLCDVRoRC14OyVFsQL0=

Anexo al oficio No. EMO/2023/PAPANTLA/86606

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301241005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CENTENARIO, PRIMERA ETAPA, TRAMO: ENTRONQUE A ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA AL MONUMENTO AL VOLADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241006	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTENARIO, PRIMERA ETAPA, TRAMO: ENTRONQUE A ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA AL MONUMENTO AL VOLADOR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No

EMO/2023/PAPANTLA/86606




SELLO DIGITAL:

swgn7Rt5XcY4lke9lBsMykwsEp5e3DkEVWECXSy4OIhXh2FzCL7ukbB/8Apd3Gri/t0FhoqsD9OXh9YGp4TJE59kvC6OYSCZ1K2e9XIWrki4XBXYe4GzU0lDEjr6lIZsLuuIKxJMupewWQ/oTtl/QY5nCLCDVRoRC14OyVFsQL0=
