



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 20,001,492.00

Hoja: 21/07/2023
 Fecha de Aprobación: 21/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Agencia Físico-Financiera				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término				
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ DE J. NUÑEZ Y DOMÍNGUEZ, INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	500.00					
2023	30	124	1103																																				
UB 01	REHABILITACIÓN DE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE, CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: GASOLINERA AGUA DULCE - ENTRADA A LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PORVENIR NÚMERO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.80	de 2		
2023	30	124	1101																																				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACION SEÑAL OLARTE DE LA COLONIA AMPLIACION LA GUADAMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	800.00			
2023	30	124	1102																																				
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005	MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	500.00			
2023	30	124	1103																																				
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002	CERRO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
2023	30	124	1104																																				
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2023	30	124	1105																																				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE COATZACOALCOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUETZ Y JUAN ESCUTTA, BARRIO DEL HANARIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	800.00		
2023	30	124	1108																																				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CANADA ENTRE CALLE RUSCO Y LIMITE FONDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,200.00		
2023	30	124	1107																																				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 3RA. ETAPA, EN LA CALLE ROSE WASHINGTON ENTRE CALLE MANRIQUITA FERRERES Y AGUSTIN YANEZ, COLONIA JOSE SOLOZAN FERRERES DE UZARD, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,200.00		
2023	30	124	1108																																				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD POLUYTA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	POLUYTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,492.00	1,816,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,400.00			
2023	30	124	1109																																				

Dr. Domingo Velasco
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 20,801,492.00

Hoja: 21/07/2023
 Fecha de Aprobación: 21/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																										Metas	Observaciones																														
	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aportada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas																																
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal			Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																								
Inicio						Termino	Inicio	Termino	Inicio																		Termino	Inicio							Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino													
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALFA OMÉGAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA (KILOMETRO 47), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00					500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00																									
2023	01	124	1110																																																							

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 20,801,492.00 20,801,492.00 0.00 2 de 2

Eric Domínguez Márquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Diana Acuña Beltrán Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Contraloría Interna
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

TRI/2023/PAPANTLA/21/07/2023

Anexo al oficio No. EMO/2023/PAPANTLA/86608

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301241100	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE DE J. NUÑEZ Y DOMINGUEZ, INCLUYE: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241101	REHABILITACIÓN DE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE, CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: GASOLINERA AGUA DULCE - ENTRADA A LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PROLONGACIÓN SERAFÍN OLARTE DE LA COLONIA AMPLIACION LA GUÁSIMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241103	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241105	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No

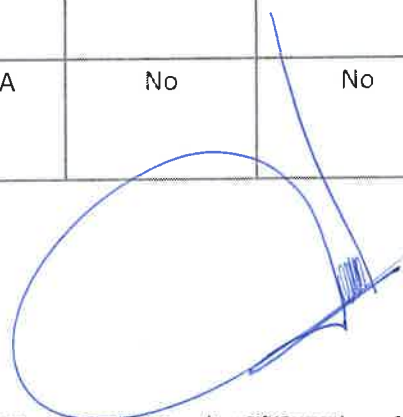



SELLO DIGITAL:

Dx90WO36pDElvbx8X6kl/SYS46BsJHbd1+xW0ibUz2pvQlptJ1Ae4y+eXW6RtvIN0ZgkMJf9SWYlw+aBHVpYCDuaHtEZJgElN2ODncv/1cw5jfkQmvyejremq6qwrAUyjtYsQXbllsxsMI9XvDipOaBzxEJHjJlOGO03jWk+M=

Anexo al oficio No. EMO/2023/PAPANTLA/86608

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301241106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE COATZACOALCOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ Y JUAN ESCUTIA, BARRIO DEL NARANJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CAÑADA ENTRE CALLE PUXCO Y LIMITE FUNDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE MARGARITA PAZ PAREDES Y AGUSTIN YAÑEZ, COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD POLUTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No
2023301241110	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALFA Y OMEGA DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA (KILÓMETRO 47), DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	No	No	No	No




SELLO DIGITAL:

Dx90W036pDEIvbx8X6kl/SYS46BsJHBd1+xW0ibUz2pvQlptJ1Ae4+eXW6RtviN0ZgkMJf9SWYlw+aBHVpYCIduaHtEZJgEIn2ODncv/1cwSjfkQmvyejremq6qwrAUytYsQXbllsxsMl9XvDipOaBzxEjHjllOGO03jWk+M=
